



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
184250 Россия, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 16, тел. (81531) 94072,
e-mail: verchenko@gov.kirovsk.ru

05 декабря 2014г.

Отчет
о результатах проведения контрольного мероприятия

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на строительство, содержание и ремонт:

- 1) детских – игровых, спортивных площадок и зон отдыха, расположенных на ул. Советская Конституция (район дома 28) и ул. Олимпийская (район дома 46);***
2) площадки для свободного выгула собак (район гостиницы туристического класса «Хибины»)

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города Кировска, Положения о Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города Кировска, п.2.4 плана работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2014 год, распоряжения Контрольно-счетного органа города Кировска от 14.10.2014 №32-р «О проведении внешней проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств» было проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на строительство, содержание и ремонт: 1) детских – игровых, спортивных площадок и зон отдыха, расположенных на ул. Советская Конституция (район дома 28) и ул. Олимпийская (район дома 46); 2) площадки для свободного выгула собак (район гостиницы туристического класса «Хибины»).»

По результатам проведения контрольного мероприятия было установлено следующее:

1. В части детской – игровой площадки, расположенной в районе дома № 46 по ул. Олимпийской:

Решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2012 № 68 «О бюджете города Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (в редакции решений от 26.03.2013 № 11, от 30.05.2013 № 29, от 25.06.2013 № 36, от 26.09.2013 № 49, от 29.10.2013 № 58, от 20.12.2013 №82) предусмотрены расходы бюджета города Кировска

на реализацию долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» в размере 39 054,9 тыс.руб. (2013 год). Долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города Кировска от 29.01.2013 №139 (в редакции от 30.05.2013 №813, от 26.07.2013 №1072, от 27.11.2013 №1612, от 27.12.2013 №1817) предусматривает средства бюджета города Кировска в размере 39 054,89 тыс.руб. (2013 год), в том числе на строительство детских игровых площадок в размере 19 432,11 тыс.руб. В таблице 1 отражен адресный перечень мероприятий указанной программы в части информации о строительстве детских – игровых площадок и заключенных муниципальных контрактах.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Муниципальный контракт, заказ		
		№	дата	Сумма, руб.
1	пр. Ленина, д.15	0349300002013000005	26.03.2013	4941803,88
2	ул. Олимпийская, район д.46			
3	ул. Советской Конституции, д.28	0349300002013000009	26.03.2013	5518869,39
4	ул. Кирова, д.2, 2а, 4, 4а, 6, 6а			
5	ул. 50 лет Октября, д.21	0349300002013000010		5236783,00
6	район озера «Верхнее»			
7	ул. Мира, д.д.3-5			
8	ул. Олимпийская д.д.18-24	0349300002013000162		215200,00
		0349300002013000147		3258000,00
9	н.п. Титан д.д. 1-5	0349300002013000161		261450,00
Итого				19 432 106,27

Отчет за 2013 год о реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы», размещенный на официальном сайте города Кировска в рамках реализации Мероприятия 2.1. «Строительство детских игровых площадок» содержит информацию о 100% исполнении (19432,11 тыс.руб.), что соответствует информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (таблица 1, <http://zakupki.gov.ru>). Вместе с тем, обращает на себя внимание отсутствие реализации запланированных в указанной долгосрочной целевой программе мероприятий в части строительства детских игровых площадок в районе озера «Верхнее» и на ул.Мира, д.д.3-5, т.е. мероприятие 2.1 «Строительство детских игровых площадок» исполнено на 100% в части расходов бюджета города Кировска, но не исполнено в части адресного перечня мероприятий программы (таблица 1).

26.03.2013 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПСП» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №0349300002013000005-0178117-01 на выполнение в 2013 году работ по строительству детских игровых площадок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 26.03.2013 по 01.07.2013 с надлежащим качеством выполнить работы по строительству детских – игровых площадок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (район многоквартирных домов №№15 по пр.Ленина, 46 по ул.Олимпийской). Цена контракта определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет 4 941 803,88 руб.

25.06.2013 подрядчиком ООО «ПСП» были выполнены работы по строительству детских игровых площадок, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 25.06.2013 №268, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25.06.2013 №268, акта от 25.06.2013 №268, счета на оплату от 25.06.2013 №268, платежного поручения от 02.07.2013 №4426630 на сумму 4941803,88 руб.

17.07.2013 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПСП» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 52 (размещение заказа №0349300002013000120) на выполнение в 2013 году работ по благоустройству детской игровой площадки по ул.Олимпийской 46. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 17.07.2013 по 16.08.2013 с надлежащим качеством выполнить работы по благоустройству детской игровой площадки по ул.Олимпийской №46. Цена контракта определена по результатам рассмотрения котировочных заявок и составляет 284 000 руб.

14.08.2013 подрядчиком ООО «ПСП» были выполнены работы по одерновке площадки и установке ограждения сетчатого «Зд» с калиткой для спортивной площадки, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 14.08.2013 №11, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2013 №11, акта от 14.08.2013 №270, счета на оплату от 14.08.2013 № 270, платежного поручения от 20.08.2013 №4712781 на сумму 284 000 руб.

09.04.2014 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Полар-Строй» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №0349300002014000035 на выполнение в 2014 году работ по ремонту, дооборудованию, озеленению, одерновке, выравниванию детских площадок, расположенных на территории города Кировска. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 09.04.2014 по 15.07.2014 с надлежащим качеством выполнить работы по благоустройству детской площадки в районе д.д.1-5 н.п. Титан; ремонту, дооборудованию и благоустройству детской площадки в районе д.28 по ул.Советская Конституция; ремонту и благоустройству площадки в районе д.46 по ул.Олимпийская. Цена контракта определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет 1 370 000 руб.

22.07.2014 подрядчиком ООО «Полар-Строй» были выполнены работы по ремонту и благоустройству площадки в районе д.46 по ул.Олимпийская, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 22.07.2014 №1, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 22.07.2014 №1, счета от 23.09.2014 №7/1, платежного поручения от 06.10.2014 №414910 на сумму 592 842 руб., платежного поручения от 06.10.2014 №414911 на сумму 460 925 руб., платежного поручения от 08.10.2014 №434213 на сумму 220333 руб. Кроме того, муниципальным казенным учреждением «УКГХ» обществу с ограниченной ответственностью была выставлена сумма неустойки (пени) в размере 95 900 рублей в соответствии с п.8.4 заключенного муниципального контракта (исх.№1987 от 07.10.2014).

В процессе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом города Кировска установлен факт неправомерного принятия и оплаты муниципальным заказчиком заведомо невыполненных работ. В частности, 21.11.2014 Контрольно-счетным органом города Кировска был осуществлен осмотр указанной детской игровой площадки и произведены замеры установленного металлического ограждения. По результатам проведения данного осмотра был составлен акт (приложение 1). В соответствии с результатами проведенных замеров было установлено следующее: на момент обследования (21.11.2014) на детской игровой площадке установлено 44,9 м металлического ограждения высотой 0,6 м; 87,4 м - высотой 2,5 м. Вместе с тем, в

соответствии с экспертным заключением от 22.07.2014, начальником производственно-технического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» по муниципальному контракту №0349300002014000035 от 09.04.2014 были приняты работы по демонтажу старого металлического ограждения и установке 108 м нового металлического ограждения высотой 2,5 м. Предоставленные пояснения МКУ «УКГХ» (исх.№2388 от 05.12.2014) подтверждают факт неисполнения условий муниципального контракта. Таким образом, действия заказчика, утвердившего невыполненные объемы работ, повлекли неправомерное расходование средств местного бюджета по муниципальному контракту №0349300002014000035 от 09.04.2014 в размере 61 658,55 руб.(таблица 2).

Таблица 2

Наименование	Сумма	Понижающий коэффициент	Итого
Прямые затраты на выполнение работ на детской площадке в районе д.46 по ул.Олимпийская	271 403,00		271 403,00
Накладные расходы на выполнение работ на детской площадке в районе д.46 по ул.Олимпийская	66 610,46	0,94	62 613,83
Сметая прибыль на выполнение работ на детской площадке в районе д.46 по ул.Олимпийская	39 634,64	0,90	35 671,18
Итого			369 688,01
Итого с понижающим коэффициентом		0,9402245	347 589,72
Итого с учетом снижения цены контракта (пени)		0,93	323 258,44
Итого с учетом фактически установленной части ограждения		0,81	261 599,89
Переплата			61 658,55

Также, при проведении Контрольно-счетным органом города Кировска осмотра территории детской игровой площадки, расположенной в районе д.46 по ул.Олимпийская установлено отсутствие 2-х светодиодных светильников размером (470*240*150), декоративной опоры (высота 3 м), установленных в соответствии с муниципальным контрактом от 26.03.2013 №0349300002013000005. Вместе с тем, муниципальный контракт от 26.03.2013 №0349300002013000005, локальная смета на выполнение в 2013 году работ по строительству детских игровых площадок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, утвержденная начальником МКУ «УКГХ» и согласованная подрядчиком ООО «ПСП» предусматривает работы по монтажу освещения в размере 82 736,85 руб. (в т.ч. установку декоративной опоры - 25 902 руб., двух светодиодных светильников на общую сумму 17 400 руб.) (таблица 3). Акты освидетельствования скрытых работ в части работ по прокладке кабеля в общем представленном пакете документов отсутствуют. На основании изложенного, Контрольно-счетным органом города Кировска установлен факт неправомерного принятия и оплаты муниципальным заказчиком заведомо невыполненных работ в части монтажа освещения детской игровой площадки.

Предоставленные пояснения МКУ «УКГХ» (исх.№2388 от 05.12.2014) подтверждают факт неисполнения условий муниципального контракта, но в части работ на общую сумму 26 451 руб.

Вместе с тем, в Контрольно-счетный орган города Кировска не поступила информация о расположении двух установленных светодиодных светильников, о размещении работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (в целях прокладки кабеля).

На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к выводу об отсутствии работ по установке освещения детской площадки. Таким образом, действия заказчика, утвердившего невыполненные объемы работ, повлекли неправомерное расходование средств местного бюджета по муниципальному контракту №0349300002014000035 от 09.04.2014 в размере 82 736,85 руб.

Таблица 3

Наименование	Сумма	Понижающий коэффициент	Итого
Прямые затраты по установке освещения на детской площадке в районе д.46 по ул.Олимпийская	70 666,72		70 666,72
Накладные расходы на детской площадке в районе д.46 по ул.Олимпийская	7 982,56		7 982,56
Сметая прибыль на детской площадке в районе д.46 по ул.Олимпийская	4 087,57		4 087,57
Итого			82 736,85
Итого с понижающим коэффициентом		0,99999997571	82 736,85

Кроме того, в процессе проверки был установлен факт незаконного размещения детской игровой площадки, построенной в соответствии с муниципальным контрактом №0349300002013000005. МКУ «УКГХ» по данному факту пояснений не предоставило, что является подтверждением согласия с установленным нарушением.

2. В части детской – игровой площадки, расположенной в районе дома №28 по ул.Советская Конституция:

26.03.2013 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Осия» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №0349300002013000009-0178117-01 на выполнение в 2013 году работ по строительству детских игровых площадок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 26.03.2013 по 01.07.2013 с надлежащим качеством выполнить работы по строительству детских – игровых площадок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (район многоквартирного дома №28 по ул. Советской Конституции и район многоквартирных домов №№2,2а,4,4а,6,6а по ул.Кирова). Цена контракта определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет 5 518 869,39 руб.

01.07.2013 подрядчиком ООО «Осия» были выполнены работы по строительству детских игровых площадок, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 01.07.2013 №1, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 01.07.2013 №1, счета на оплату от 15.07.2013 №6, платежного поручения от 02.08.2013 №4619237 на сумму 5518869,39 руб.

09.04.2014 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Полар-Строй» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №0349300002014000035 на выполнение в 2014 году работ по ремонту, дооборудованию, озеленению, одерновке, выравниванию детских площадок, расположенных на территории города Кировска. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 09.04.2014 по 15.07.2014 с надлежащим качеством выполнить работы по благоустройству детской площадки в районе д.д.1-5 н.п. Титан; ремонту, дооборудованию и благоустройству детской площадки в районе д.28 по ул. Советская Конституция; ремонту и

благоустройству площадки в районе д.46 по ул.Олимпийская. Цена контракта определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет 1 370 000 руб.

23.09.2014 подрядчиком ООО «Полар-Строй» были выполнены работы по ремонту и благоустройству площадки в районе д.28 по ул.Советской Конституции, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 22.07.2014 №1, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 22.07.2014 №1, счета от 23.09.2014 №7/1, платежного поручения от 06.10.2014 №414910 на сумму 592 842 руб., платежного поручения от 06.10.2014 №414911 на сумму 460 925 руб., платежного поручения от 08.10.2014 №434213 на сумму 220333 руб. Кроме того, муниципальным казенным учреждением «УКГХ» обществу с ограниченной ответственностью была выставлена сумма неустойки (пени) в размере 95 900 рублей в соответствии с п.8.4 заключенного муниципального контракта (исх.№1987 от 07.10.2014).

Кроме того, в процессе проверки был установлен факт незаконного размещения детской игровой площадки, построенной в соответствии с муниципальным контрактом №0349300002013000009. МКУ «УКГХ» по данному факту пояснений не предоставило, что является подтверждением согласия с установленным нарушением.

Факты нецелевого использования бюджетных средств, связанные со строительством, содержанием и ремонтом детской игровой площадки, расположенной в районе д.28 по ул.Советской Конституции не установлены.

3. В части площадки для выгула собак, расположенной в районе гостиницы туристического класса «Хибины»:

Решением Совета депутатов города Кировска от 20.12.2013 № 81 «О бюджете города Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 25.03.2014 № 14; от 10.06.2014 № 51; от 26.08.2014 № 58) предусмотрены расходы бюджета города Кировска на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в размере 21 456 261 руб. (2014 год). Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации города Кировска от 14.04.2014 №506 (в редакции постановления Администрации города Кировска от 08.05.2014 №655, от 30.06.2014 №875, от 17.09.2014 №1209) предусматривает средства бюджета города Кировска в размере 21 456 261 руб. (2014 год), в том числе на строительство площадки для свободного выгула собак (задача 7) в размере 389 010 руб.

22.04.2014 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПСП» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №0349300002014000062-0178117-01 на строительство в 2014 году на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией площадки для выгула собак. Согласно данного договора подрядчик обязуется в срок с 22.04.2014 по 15.07.2014 с надлежащим качеством выполнить строительство площадки для выгула собак в районе гостиницы туристического класса «Хибины». Цена контракта определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет 389 001, 04 руб.

10.07.2014 подрядчиком ООО «ПСП» были выполнены работы по строительству площадки для выгула собак, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 10.07.2014 №1, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 10.07.2014 №1, акта от 10.07.2014 №129, счета на оплату от 10.07.2014 №129, платежного поручения от 30.07.2014 №20797 на сумму 389 001,04 руб.

Кроме того, в процессе проверки был установлен факт незаконного размещения площадки для выгула собак, построенной в соответствии с муниципальным контрактом №0349300002014000062. МКУ «УКГХ» по данному факту пояснений не предоставило, что является подтверждением согласия с установленным нарушением.

Факты нецелевого использования бюджетных средств, связанные с размещением площадки для выгула собак не установлены.

Выводы:

В процессе проведения контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на строительство, содержание и ремонт: 1) детских – игровых, спортивных площадок и зон отдыха, расположенных на ул.Советская Конституция (район дома 28) и ул.Олимпийская (район дома 46); 2) площадки для свободного выгула собак (район гостиницы туристического класса «Хибины»).»

- 1) Установлены факты неправомерного принятия и оплаты заведомо невыполненных работ по муниципальному контракту от 26.03.2013 №0349300002013000005, от 09.04.2014 №0349300002014000035. В результате чего, неправомерное расходование средств местного бюджета составило 144 395,40 руб.;
- 2) Установлены факты незаконного размещения детских игровых площадок и площадки для выгула собак.

Контрольно-счетным органом, вынесено и направлено в адрес МКУ «Управление Кировским городским Хозяйством» представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений.

**Председатель
Контрольно-счетного органа города Кировска**

С.С. Верченко

Акт осмотра
детской игровой площадки, расположенной в районе дома 46 по ул.Олимпийской

г.Кировск

21.11.2014

Комиссия в составе:

Председатель Контрольно-счетного органа города Кировска - С.С. Верченко
Начальник отдела контрольно-аналитических мероприятий - И.А. Богданов

Произвела замеры металлического ограждения детской игровой площадки, расположенной в районе дома 46 по ул.Олимпийской. Результаты замеров отражены на рисунке 1.

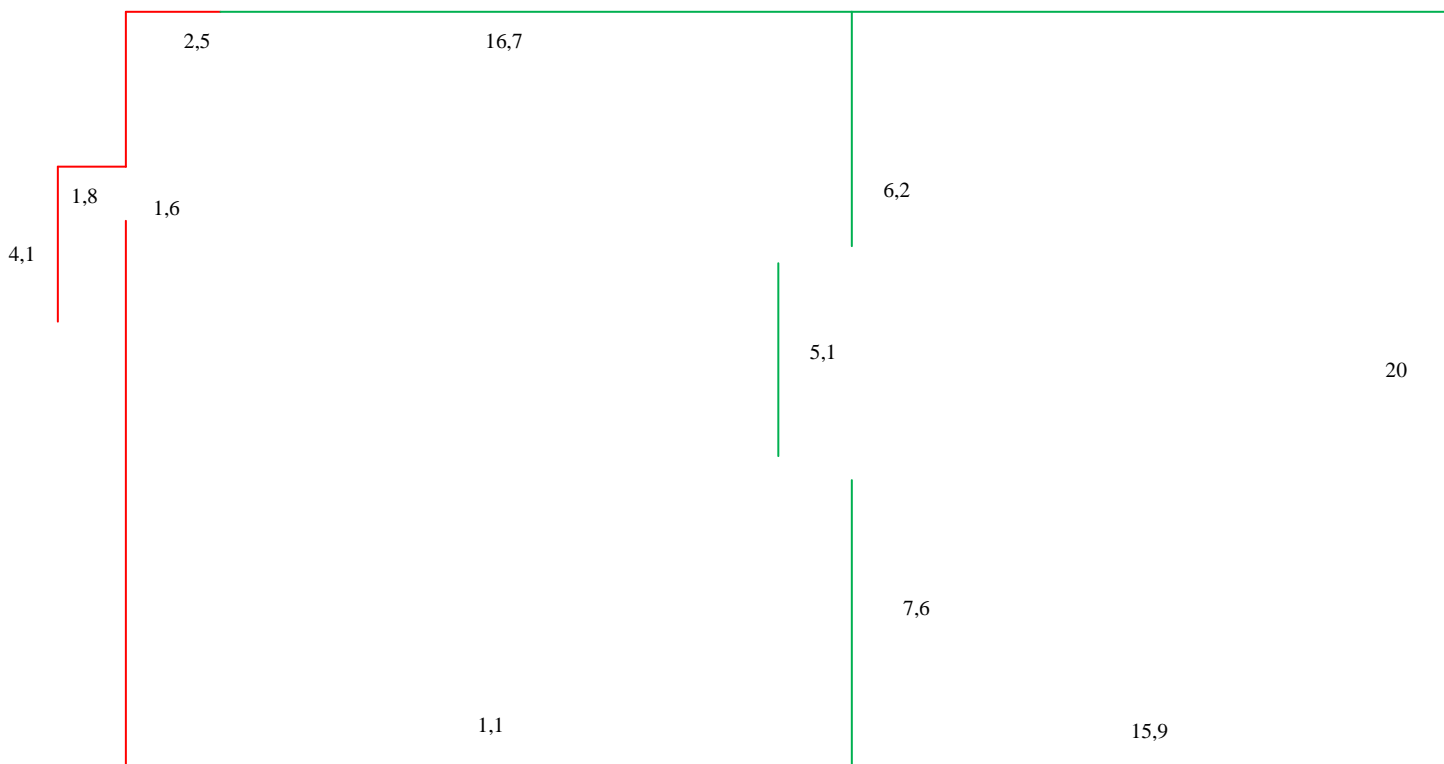


Рис.1 Результаты замеров металлического ограждения (м) детской игровой площадки, расположенной в районе дома 46 по ул.Олимпийской

Примечание:

Красные линии – металлическое ограждение высотой 0,6м
Зеленые линии – металлическое ограждение высотой 2,5м

Председатель
Контрольно-счетного органа города Кировска

С.С. Верченко

Начальник
отдела контрольно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетного органа города Кировска

И.А. Богданов
