



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН  
ГОРОДА КИРОВСКА  
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ  
ТЕРРИТОРИЕЙ**

**Главе администрации города Кировска**

**С.В. Свинину**

184250, г. Кировск Мурманской области  
пр. Ленина, д.16, тел. 9-87-15

№01-21/2017-КСО от 22.08.2017  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Об оплате невыполненных объемов работ*

*Почему не платите*

**Уважаемый Сергей Вадимович!**

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2017 год, положением о Контрольно-счетном органе города Кировска проводится контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на реализацию ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2016 год».

Между МКУ «УКГХ» в лице начальника учреждения Михайловой М.Е. и ООО «Полар-Строй» заключен муниципальный контракт №0349300002016000056-0178117-02 от 17.08.2016 на выполнение в 2016 году работ по ремонту, дооборудованию спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 15.09.2016 с надлежащим качеством поставить спортивное оборудование и ограждения, и выполнить работы по их установке и монтажу на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Цена контракта (стоимость работ) определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет 551 174 руб. 00 копеек. Гарантийный срок на поставляемый товар и выполняемые по настоящему контракту работы: 2 года со дня подписания акта о приемке выполненных работ на объектах.

Согласно п.7.2 технического задания (приложение №1 к муниципальному контракту) ограждение площадки, расположенной в районе д.д. 23-23а по пр.Ленина, должно быть выполнено в антивандальном исполнении из стальной профильной трубы. Секции должны представлять собой раму из стальной профильной трубы 40х20 мм и заполнение в виде сварной решетки из стальной трубы 20х20 мм. Секции должны быть установлены на столбы, изготовленные из стальной профильной трубы 50х50 мм, согласно прилагаемому эскизу ограждения (приложение №2 к контракту) размером 2000 мм х 3000 мм. Для целостности и надежности всей конструкции ограждения в целом, предусмотреть усиление ограждения по периметру профилированной трубой крепления для фиксации опорных столбов и секций ограждения.

15.09.2016 подрядчик выполнил работы по контракту, а заказчик принял и оплатил работы согласно товарной накладной №8 от 22.08.2016, счета на оплату №6 от 21.10.2016, акта о приемке выполненных работ №1 от 15.09.2016, справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 15.09.2016, платежного поручения №66450 от 18.11.2016 на сумму в размере 551 174 руб.

Согласно п.1, п.4 акта о приемке выполненных работ произведена установка 34 столбов размером 50х50 мм, толщиной стенки 3 мм.

21.06.2017 при осмотре спортивной площадки, расположенной в районе д.д.23-23а по пр.Ленина было установлено следующее.

1. На площадке установлено 10 столбов высотой 3 м и 20 столбов высотой 2 м;
2. Столбы изготовлены из трубы размером 80 мм х 60 мм;
3. Схема площадки представлена на рис.5.

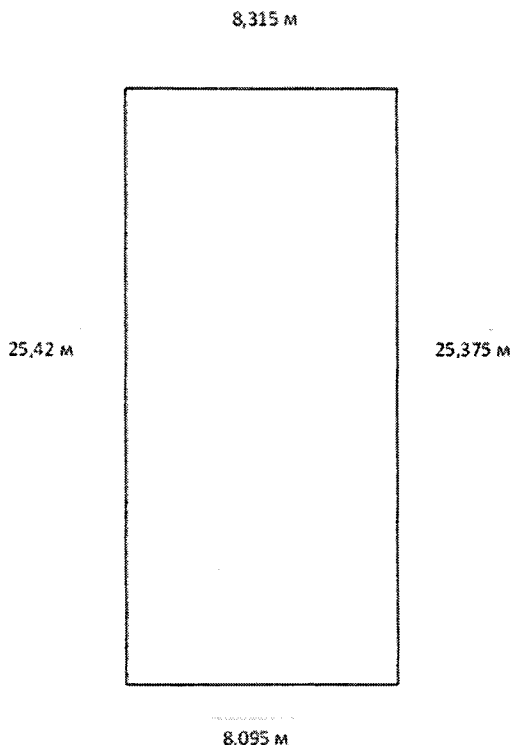


Рис.1

Более того, в процессе осмотра спортивной площадки установлено, что фактически работы по установке 34 металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание в рамках муниципального контракта №0349300002016000056-0178117-02 от 17.08.2016 произведены не были. Фактически на спортивной площадке находятся металлические столбы, установленные в рамках муниципального заказа № 0349300002013000004, размещенного на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок ([http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order\\_document\\_list\\_info/show?source=erpz&notificationId=5360317](http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show?source=erpz&notificationId=5360317)). К данному выводу Контрольно-счетный орган города Кировска приходит на основании сопоставления фотографий спортивной площадки, сделанных в 2014 году, 2017 году (приложение 1-6). В частности:

1. Установленные столбы не соответствуют техническому заданию (приложение №1 к муниципальному контракту №0349300002016000056-0178117-02 от 17.08.2016);
2. Фактическое количество столбов не соответствует количеству столбов принятому по акту о приемке выполненных работ №1 от 15.09.2016;
3. По состоянию на 21.06.2017 на столбах ограждения присутствуют остатки крепежной системы и дефекты ограждения, установленного в рамках муниципального заказа № 0349300002013000004.

На основании изложенного, оплата невыполненных объемов работ составляет 147 291,62 руб. (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п акта выполненных работ	Наименование	Общая стоимость, руб.				Всего с учетом корректирующего коэффициента (сумма руб.)	Фактически выполнено		Ущерб, руб.
		Прямые затраты	Оплата труда	Эксплуатация машин			Сумма	Примечание	
				всего	в т.ч. Оплата труда	0,998646			
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	8767	1982	6785	1771	14 290,32	0	Металлические столбы установлены ранее	14 290,32
2	Устройство металлических ограждений	13928	8753	1090		29 782,10	29174,3	Из 68,6 м ограждения установлено 67,2 м	607,80
3	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм	15177	0	0	0	17 884,61	0		17 884,61
4	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, размером 50*50 мм	97173				114 508,88	0	Металлические столбы установлены ранее	114 508,88
	Итого								147 291,62

Вместе с тем, в рамках контрольного мероприятия в Контрольно-счетный орган города Кировска поступили документы о принятии работ в рамках муниципального контракта №0349300002016000056-0178117-02 от 17.08.2016 в полном объеме, в т.ч. с документами свидетельствующими о принятии скрытых работ представителями заказчика.

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска для проведения процессуальной проверки в соответствии со ст. ст. 144-145 УПК РФ.

С уважением,

Председатель  
Контрольно-счетного органа города Кировска

С.С. Верченко
